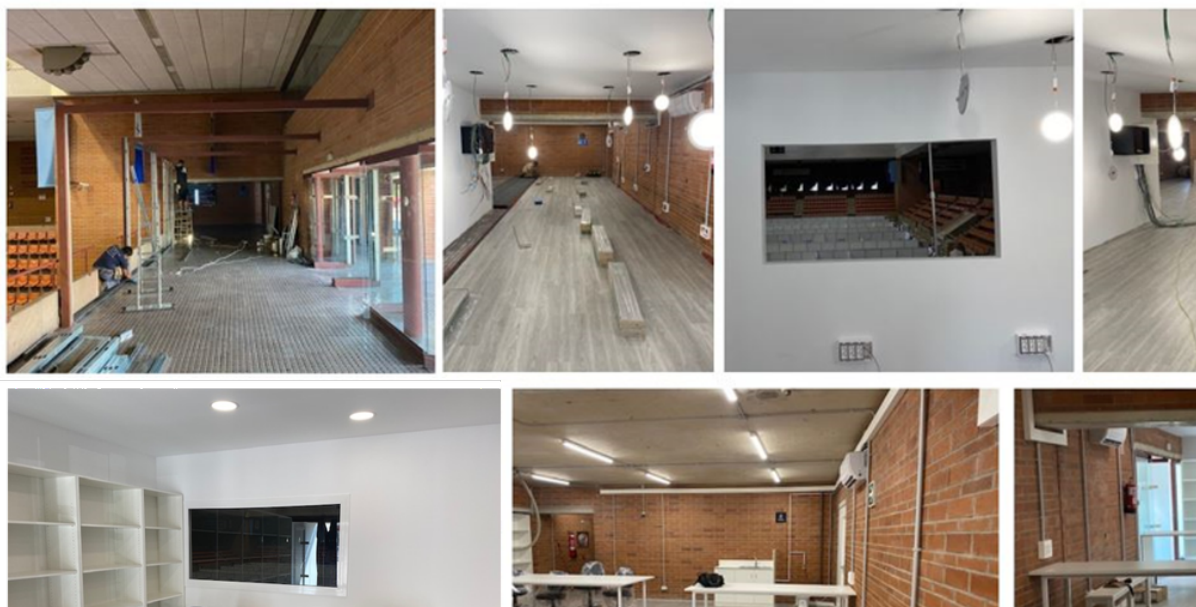



Obra de construcció d'un laboratori al Pavelló de Pilota de Vall d'Hebron per a la realització massiva de proves PCR, dins del pla de contingència de l'epidèmia SARS-CoV-2 de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

El present contracte té per objecte la remodelació dels espais al pavelló de Vall d'Hebron per a la construcció d'un laboratori provisional on es realitzaran tests Covid-19, provisional dins del Pla de contingència de la pandèmia del SARS-CoV-2.

Es construirà un espai tancat a la zona de pas sobre les grades del públic, per a la qual cosa serà necessari aixecar parets de pladur i realitzar treballs d'instal·lació elèctrica i il·luminació, subministrar i instal·lació de mobiliari i treballs de ventilació i fontaneria.

Aquests treballs es faran urgentment, i serà necessari coordinar els treballs en tres torns i diversos contractes, per tal d'arribar a la dada sol·licitada per els serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i l'Hospital Vall d'Hebron.

**Dades Generals:**

Propietat:	✓ Hospital Vall d'Hebron
Àmbit geogràfic:	✓ Pavelló esportiu de Vall d'Hebron de Barcelona
Pressupost:	✓ 32.112,74 € (IVA Inclòs)
Data d'inici:	✓ 26 Març 2020
Termini:	✓ 31 Març 2020

RUBATEC

Hospital Vall d'Hebron


C.E.M VALL d'HEBRON (BARCELONA)

Obra de construcció d'un laboratori al Pavelló de Pilota de Vall d'Hebron per a la realització massiva de proves PCR, dins del pla de contingència de l'epidèmia SARS-CoV-2 de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Instal·lació elèctrica



Encavallades de tub estructural

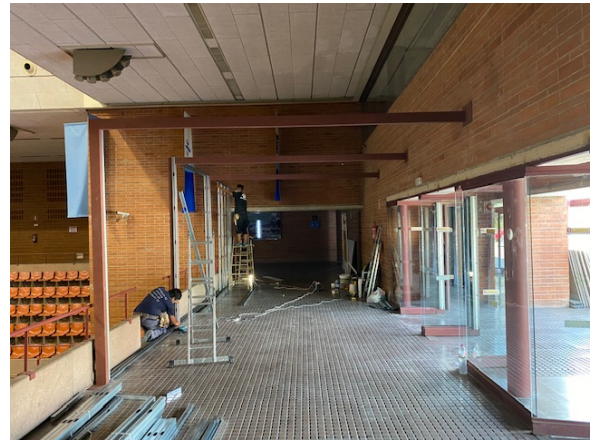

Instal·lació de parquet



Ampliació d'àrea de laboratori




RUBATEC

Hospital Vall d'Hebron

C.E.M VALL d'HEBRON (BARCELONA)

Obra de construcció d'un laboratori al Pavelló de Pilota de Vall d'Hebron per a la realització massiva de proves PCR, dins del pla de contingència de l'epidèmia SARS-CoV-2 de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Imatges del laboratori finalitzat

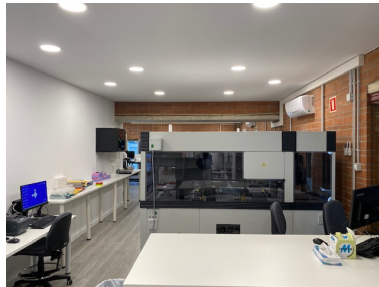

Obra de construcció d'un laboratori al Pavelló de Pilota de Vall d'Hebron per a la realització massiva de proves PCR, dins del pla de contingència de l'epidèmia SARS-CoV-2 de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Dades Tècniques:

Cable UTP, cat.6, lliure d'halògens:	✓ 520 ml
instal·lació de quadres y proteccions para allotjar las noves línies.	✓ 1 ut
Instal·lació de llumeneres estanques i/o encastades:	✓ 16 ut
Instal·lació de caixa porta mecanismes modular:	✓ 8 ut
Instal·lació de encavallades fabricats amb tub estructural:	✓ 3 ut
Fals sostre continu suspès:	✓ 40m2
Envà senzill, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2):	✓ 98 m2
Instal·lació de cable de coure:	✓ 100 ml
Llocs de treball T/C+V/D per a ordinadors:	✓ 18 ut
Pintura al tremp llis:	✓ 140 m2
Instal·lació de parquet FINSA AC-4:	✓ 100 m2
aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura:	✓ 98 m2
Mobiliari divers	
